

INFORME DE COMISION INSTITUCIONAL -ARRN

Fecha:	5 de Marzo de 2024.-
Fecha de Comisión:	Del 27 al 28 de Febrero de 2024.-
Nombre del Funcionario comisionado:	<ul style="list-style-type: none"> • Jorge Balcázar • Fernando Pio Barrios
DGTICS Direccion de Seguridad Fisica	
Lugar de Comisión:	27-Ciudad de Pilar– Departamento de Ñeembucú. 28-Ciudad de Alberdi– Departamento de Ñeembucú.
Móvil asignado:	Vehículo particular

Actividades:

Día 1 - 27 de Febrero	<ul style="list-style-type: none"> • Traslado a la ciudad de Pilar • Verificación de la situación del equipo de monitoreo. • Carga de Batería • Verificación del generador • Contratación de servicio eléctrico para arreglo de media tensión. • Configuración de equipo de mikrotik • Puesta en marcha del equipo de monitoreo • Traslado a la ciudad de Alberdi
Día 2 – 28 de febrero	<ul style="list-style-type: none"> • Traslado a la prefectura de Alberdi • Verificación de la situación del equipo de monitoreo. • Verificación del Generador (Batería Agotada) • Limpieza de agua acumulada por perdida de aire acondicionado • UPS no enciende (Debe ser reemplazada) • Configuración de equipo Mikrotik • Traslado a la Ciudad de San Lorenzo
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Se necesita una realizar una segunda visita a las estaciones de Pilar y Alberdi para poner en óptimas condiciones. • Pilar: Realizar configuraciones en el equipo Mikrotik poner en modo Untagged coordinar con la gente de Copaco • Alberdi Reemplazar la Batería del Generador, reemplazar la UPS (De Parque Guazu)

Jorge Balcázar

Fernando Pio Barrios

FICHA

INSPECCION DE ESTACIONES DE MONITOREO – ARRN

LISTA DE VERIFICACION

FECHA DE VERIFICACION: 28/02/2024

ESTACION – CIUDAD: Alberdi.....

ITEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	BUENO	REGULAR	MALO	
1. GENERADOR				
COMBUSTIBLE	X			
ACEITE - MOTOR	X			
CONEXIONES ELECTRICAS	X			
ESTADO DE BATERIA	X			Bateria agotada necesita ser reemplazada
ESTADO GRAL VISUAL		X		
2. CASETA				
ESTADO GRAL VISUAL		X		Se necesita pintar carpeta de cemento del vallado perimetral
LUCES INT/EXT		X		
AIRE ACONDICIONADO			X	Agua dentro de la caseta por problemas de cañería
SISTEMA ELECTRICO	X			
CERCA PERIMETRAL		X		
SEÑALETICAS		X		
3. ESTACION DE MONITOREO - AEROSOL				
ESTADO GRAL VISUAL	X			
PAPEL	X			35 milímetros de distancia
SISTEMA DE MONITOREO	X			
RED - VPN	X			Se procedió a la configuración del Router Mikrotik para la VPN
ÍLOGO	X			
PLC	X			
4. DAVIS (EST. METEOROLOGICA)				
ESTADO GRAL VISUAL	X			
CAPTADOR DE LLUVIA	X			
SENSOR DE VIENTO	X			
SENSOR DE TEMPERATURA	X			
RED	X			
CONEXIÓN ELECTRICA	X			
5. UPS				
ESTADO GRAL. VISUAL			X	UPS necesita ser revisado se traslada a Asunción debe ser reemplazada
ESTADO DE LA BATERIA			X	
VOLTAJE RECIBIDO			X	
6- COMUNICACION				
SWITCH	X			
FIBRA – VPN-MULTIPLEX			X	Se realizo la configuración Mikrotik – Fortinet via Ipsec tunnel
7- ADJUNTAR FOTOS	SI	NO		

INSPECCIONADO POR:

JORGE RAFAEL BALCAZAR MARTINEZ
AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

FIRMA:

Fís. Fernando Pío Barrios
Director
DSFS - ARRN



FICHA

INSPECCION DE ESTACIONES DE MONITOREO – ARRN

LISTA DE VERIFICACION

FECHA DE VERIFICACION: 27/02/2024

ESTACION – CIUDAD: Pilar.....

ITEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	BUENO	REGULAR	MALO	
1. GENERADOR				
COMBUSTIBLE	X			
ACEITE - MOTOR	X			
CONEXIONES ELECTRICAS	X			
ESTADO DE BATERIA	X			Se realizo la recarga de la batería por falta de carga
ESTADO GRAL VISUAL		X		
2. CASETA				
ESTADO GRAL VISUAL		X		Se necesita arreglar carpeta de cemento vallado perimetral
LUCES INT/EXT		X		
AIRE ACONDICIONADO	X			
SISTEMA ELECTRICO			X	Se procedio a contratar un servicio eléctrico por corte de cable.
CERCA PERIMETRAL		X		Se necesita limpieza de malezas
SEÑALETICAS		X		
3. ESTACION DE MONITOREO - AEROSOL				
ESTADO GRAL VISUAL	X			
PAPEL	X			35 milímetros de distancia
SISTEMA DE MONITOREO	X			
RED - VPN	X			
ÍLOGO	X			
PLC	X			
4. DAVIS (EST. METEOROLOGICA)				
ESTADO GRAL VISUAL	X			
CAPTADOR DE LLUVIA	X			
SENSOR DE VIENTO	X			
SENSOR DE TEMPERATURA	X			
RED	X			
CONEXIÓN ELECTRICA	X			
5. UPS				
ESTADO GRAL. VISUAL	X			
ESTADO DE LA BATERIA	X			
VOLTAJE RECIBIDO	X			
6- COMUNICACION				
SWITCH	X			
FIBRA – VPN-MULTIPLEX			X	NO se pudo realizar configuración por falta de energía en el NOC de copaco
7- ADJUNTAR FOTOS	SI	NO		





INSPECCIONADO POR:

JÓRGE RAFAEL BALCAZAR MARTÍNEZ
AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR

FIRMA:

Fís. Fernando Pío Barrios
Director
DSFS - ARRN



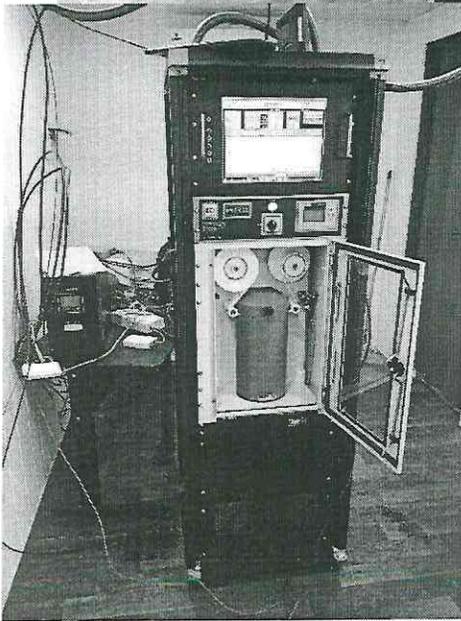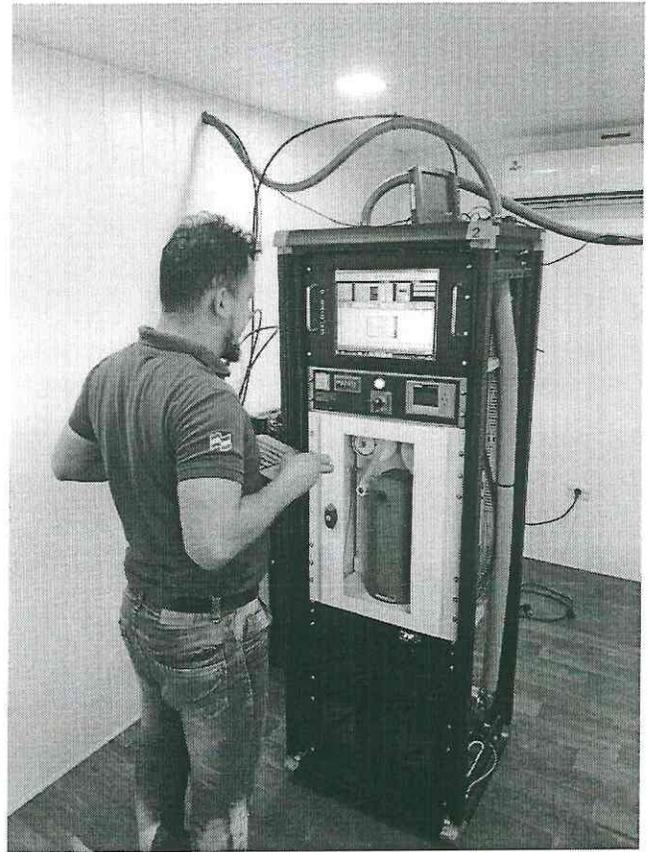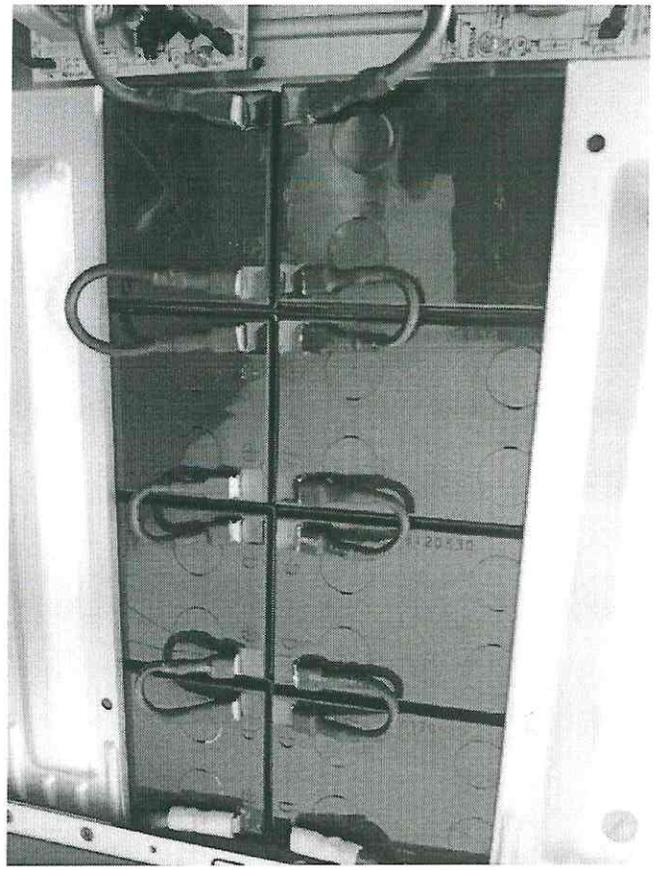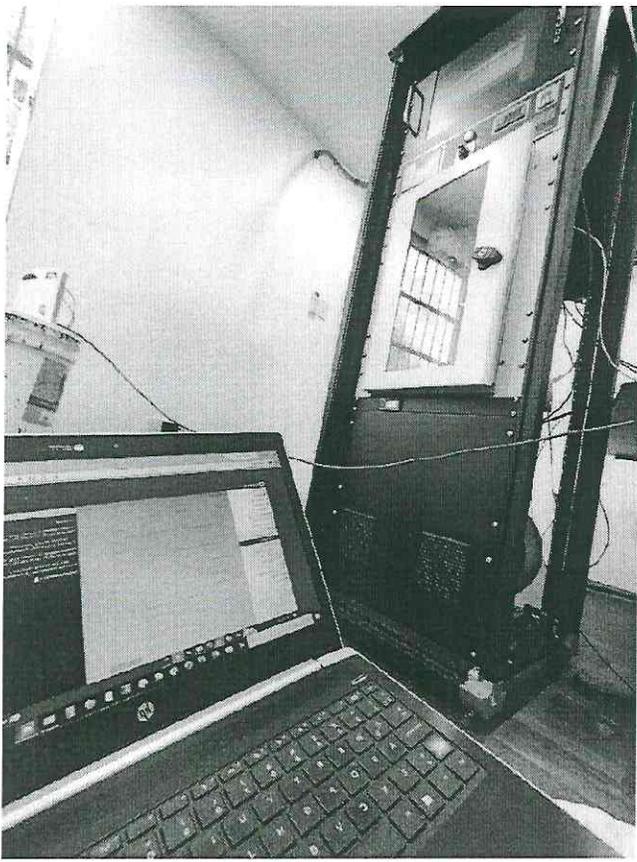

Fís. Fernando Río Barrios
Director
DSFS - ARRN



JORGE RAFAEL BALCAZAR MARTÍNEZ
AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR
